

Crèche de Sceaux
Groupe LES PETITES CANAILLES
146, rue Houdan - Sceaux (92330)



Maître d'Ouvrage :



LES PETITES CANAILLES
36, rue Pierret
92200 - Neuilly sur Seine
Tél : 01 58 83 48 35

Maître d'Œuvre :



ORCHESTRA AGENCEMENTS SAS
57, rue Dalayrac
94120 Fontenay-sous-bois
Tél : 01 41 79 53 62

Crèche de Sceaux
Groupe LES PETITES CANAILLES
146, rue Houdan - Sceaux (92330)

SOMMAIRE

- Plan existant RDC / sous sol
- Plan projet RDC / sous sol
- Plan de carottage sous sol
- Plan existant / projet façade côté rue
- Plan existant / projet façade côté jardin
- Coupe de principe détail de la terrasse extérieure
- Plan existant jardin
- Plan projet jardin
- Descriptif travaux
- Planning prévisionnel travaux
- Demande AG

Maître d'Ouvrage :





LES PETITES CANAILLES
36, rue Pierret
92200 - Neuilly sur Seine
Tél : 01 58 83 48 35

Maître d'Œuvre :



ORCHESTRA AGENCEMENTS SAS
57, rue Dalayrac
94120 Fontenay-sous-bois
Tél : 01 41 79 53 62

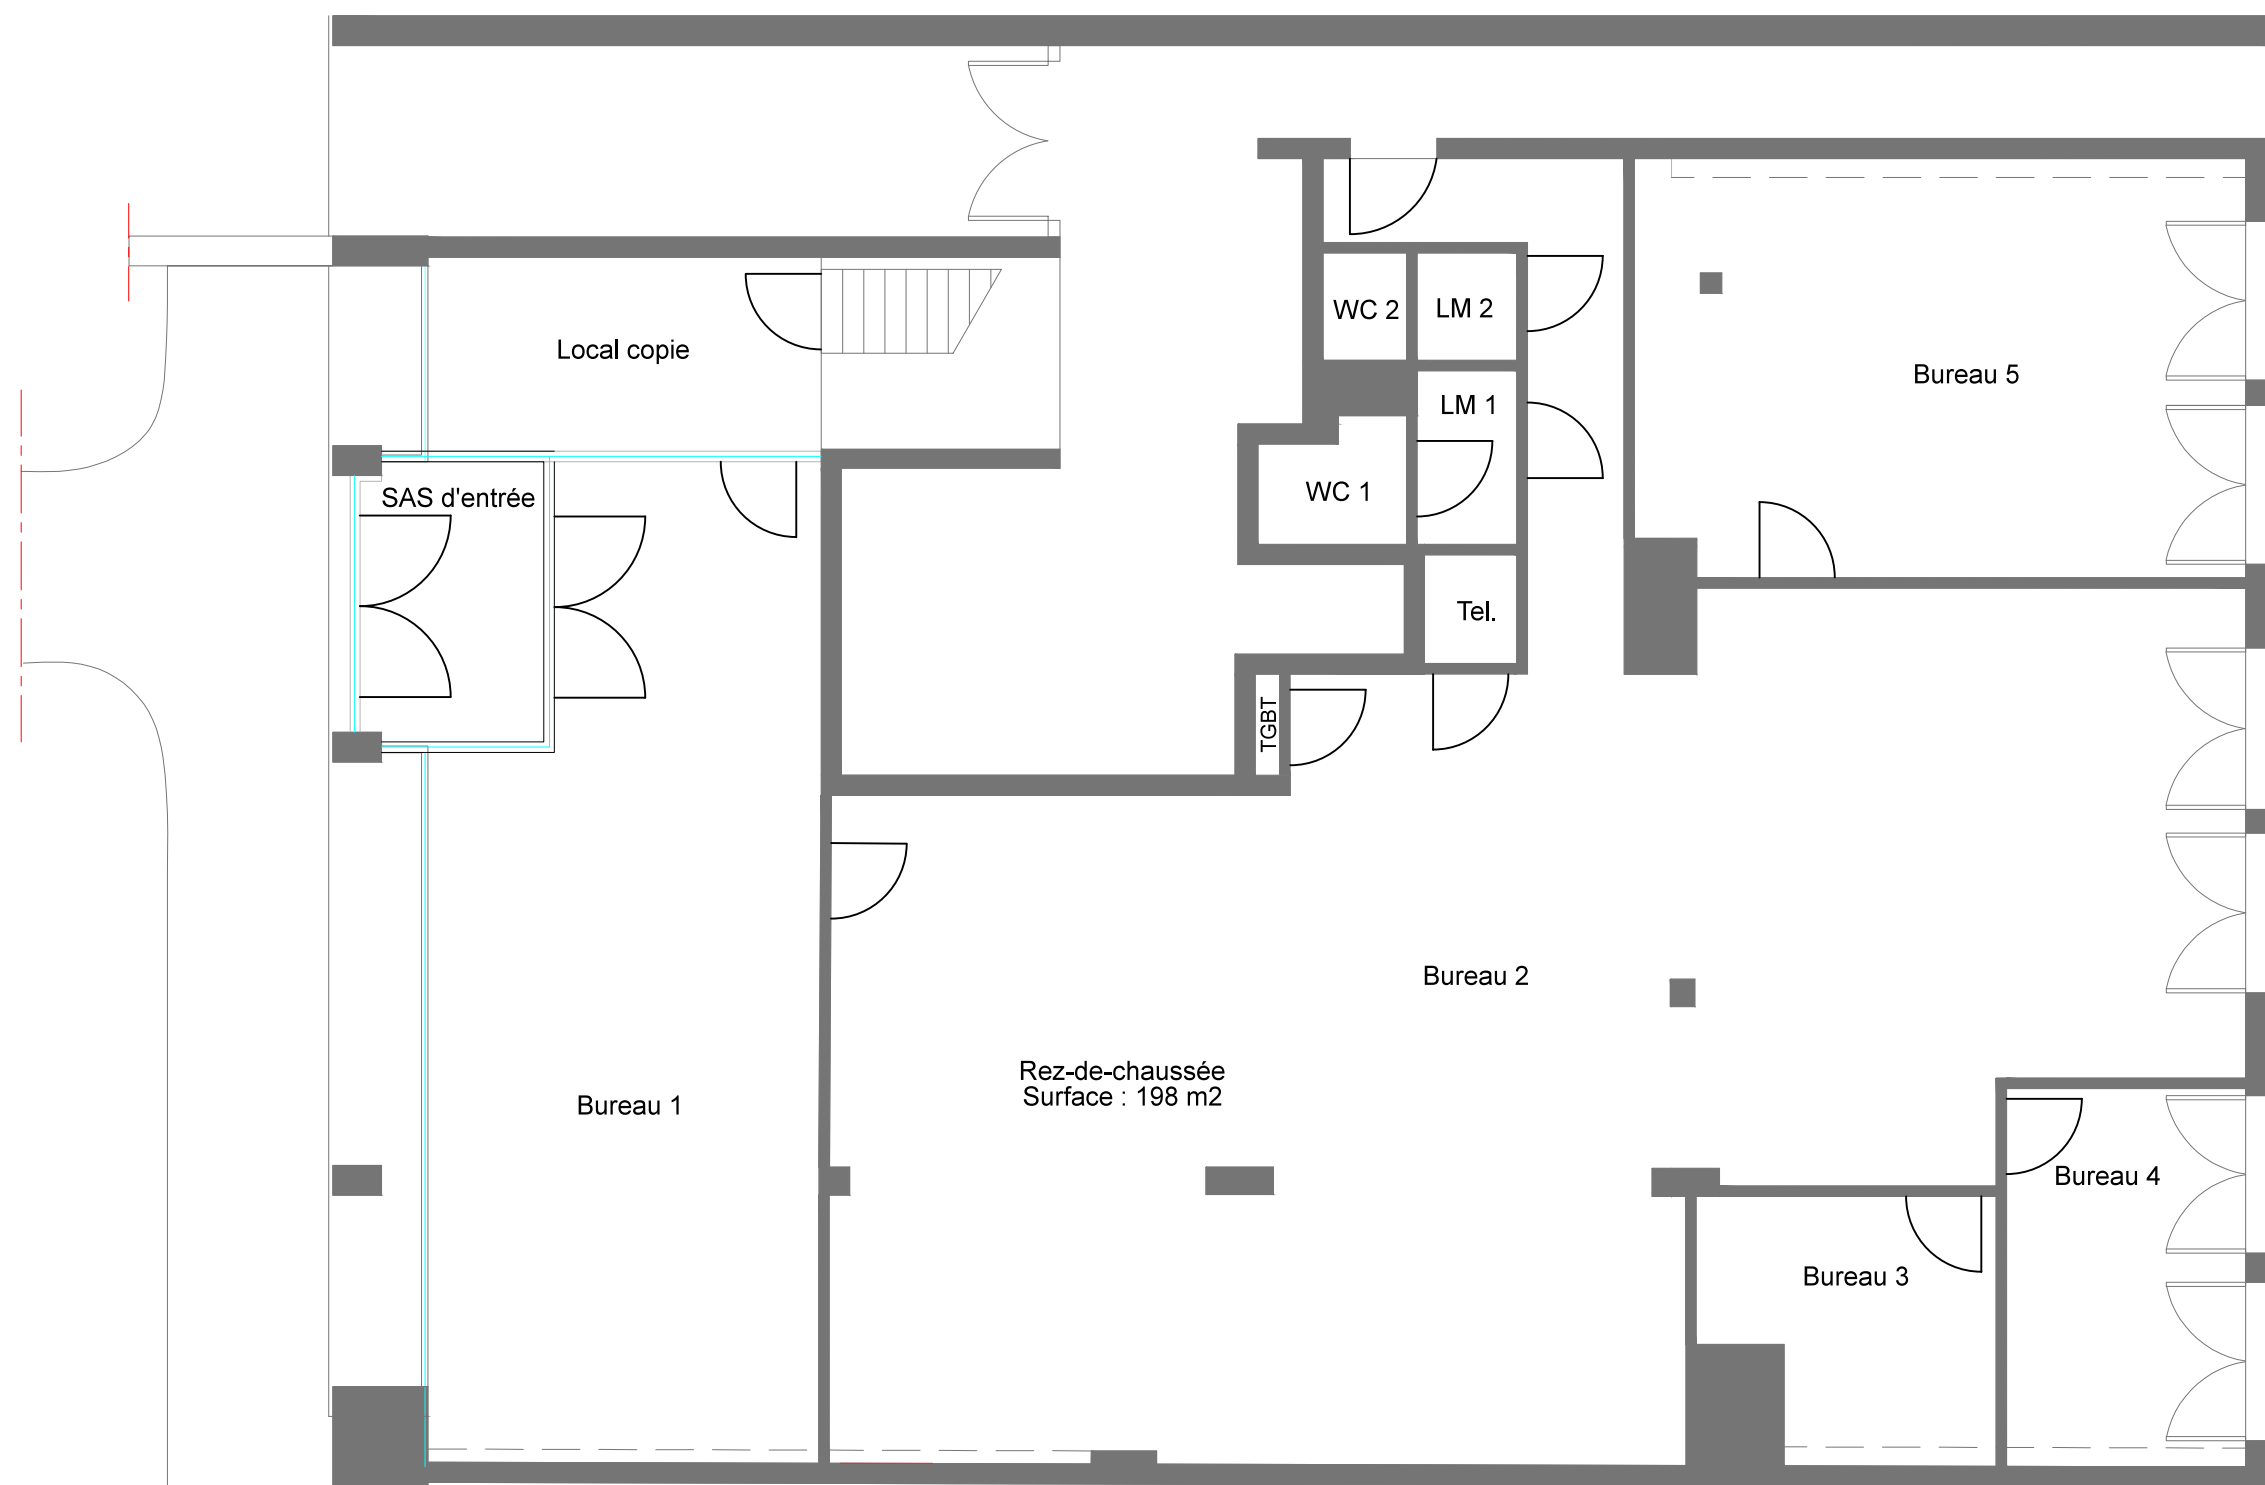

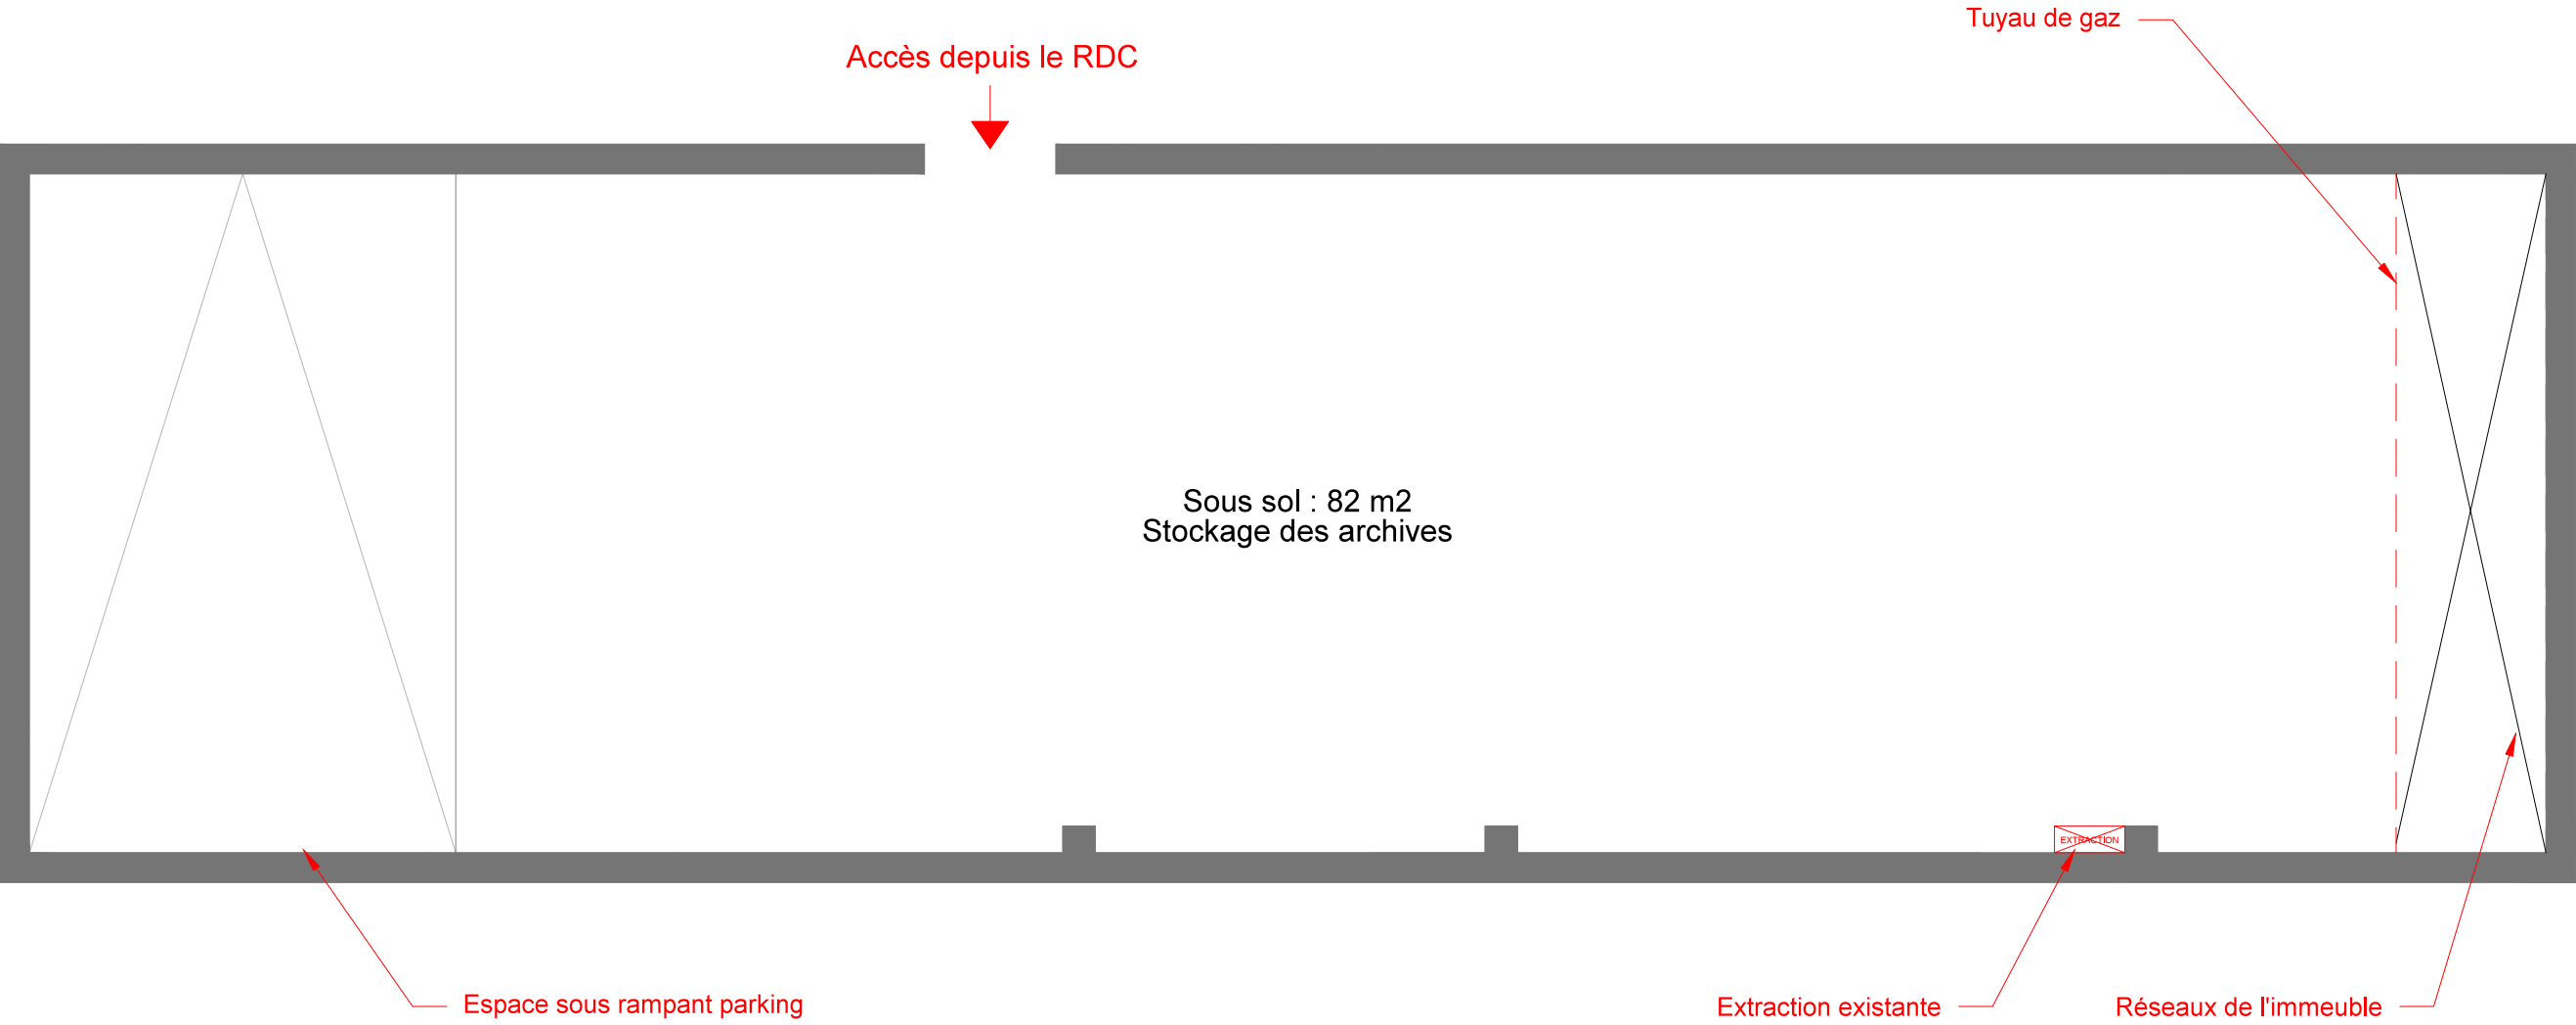


Maître d'oeuvre Orchestra Agencements SAS
57 rue Dalayrac 94120 Fontenay sous-bois
Tél : 01 41 79 53 62

Maître d'ouvrage LES PETITES CANAILLES
36 rue Pierret - 92200 Neuilly sur Seine
Tél : 01 58 83 48 35


Affaire LPC SCEAUX - 25 Berceaux
Surface : 280 m2



Libellé
Plan existant sous sol

Resp. Dossier : Benoît CHAMPIGNEUX			
Tél : 06 48 18 04 03	Mail : benoit.orchestra@orange.fr		
Date : 05 / 03 / 2018	Indice : 0	Echelle : 1/50	Format : A3

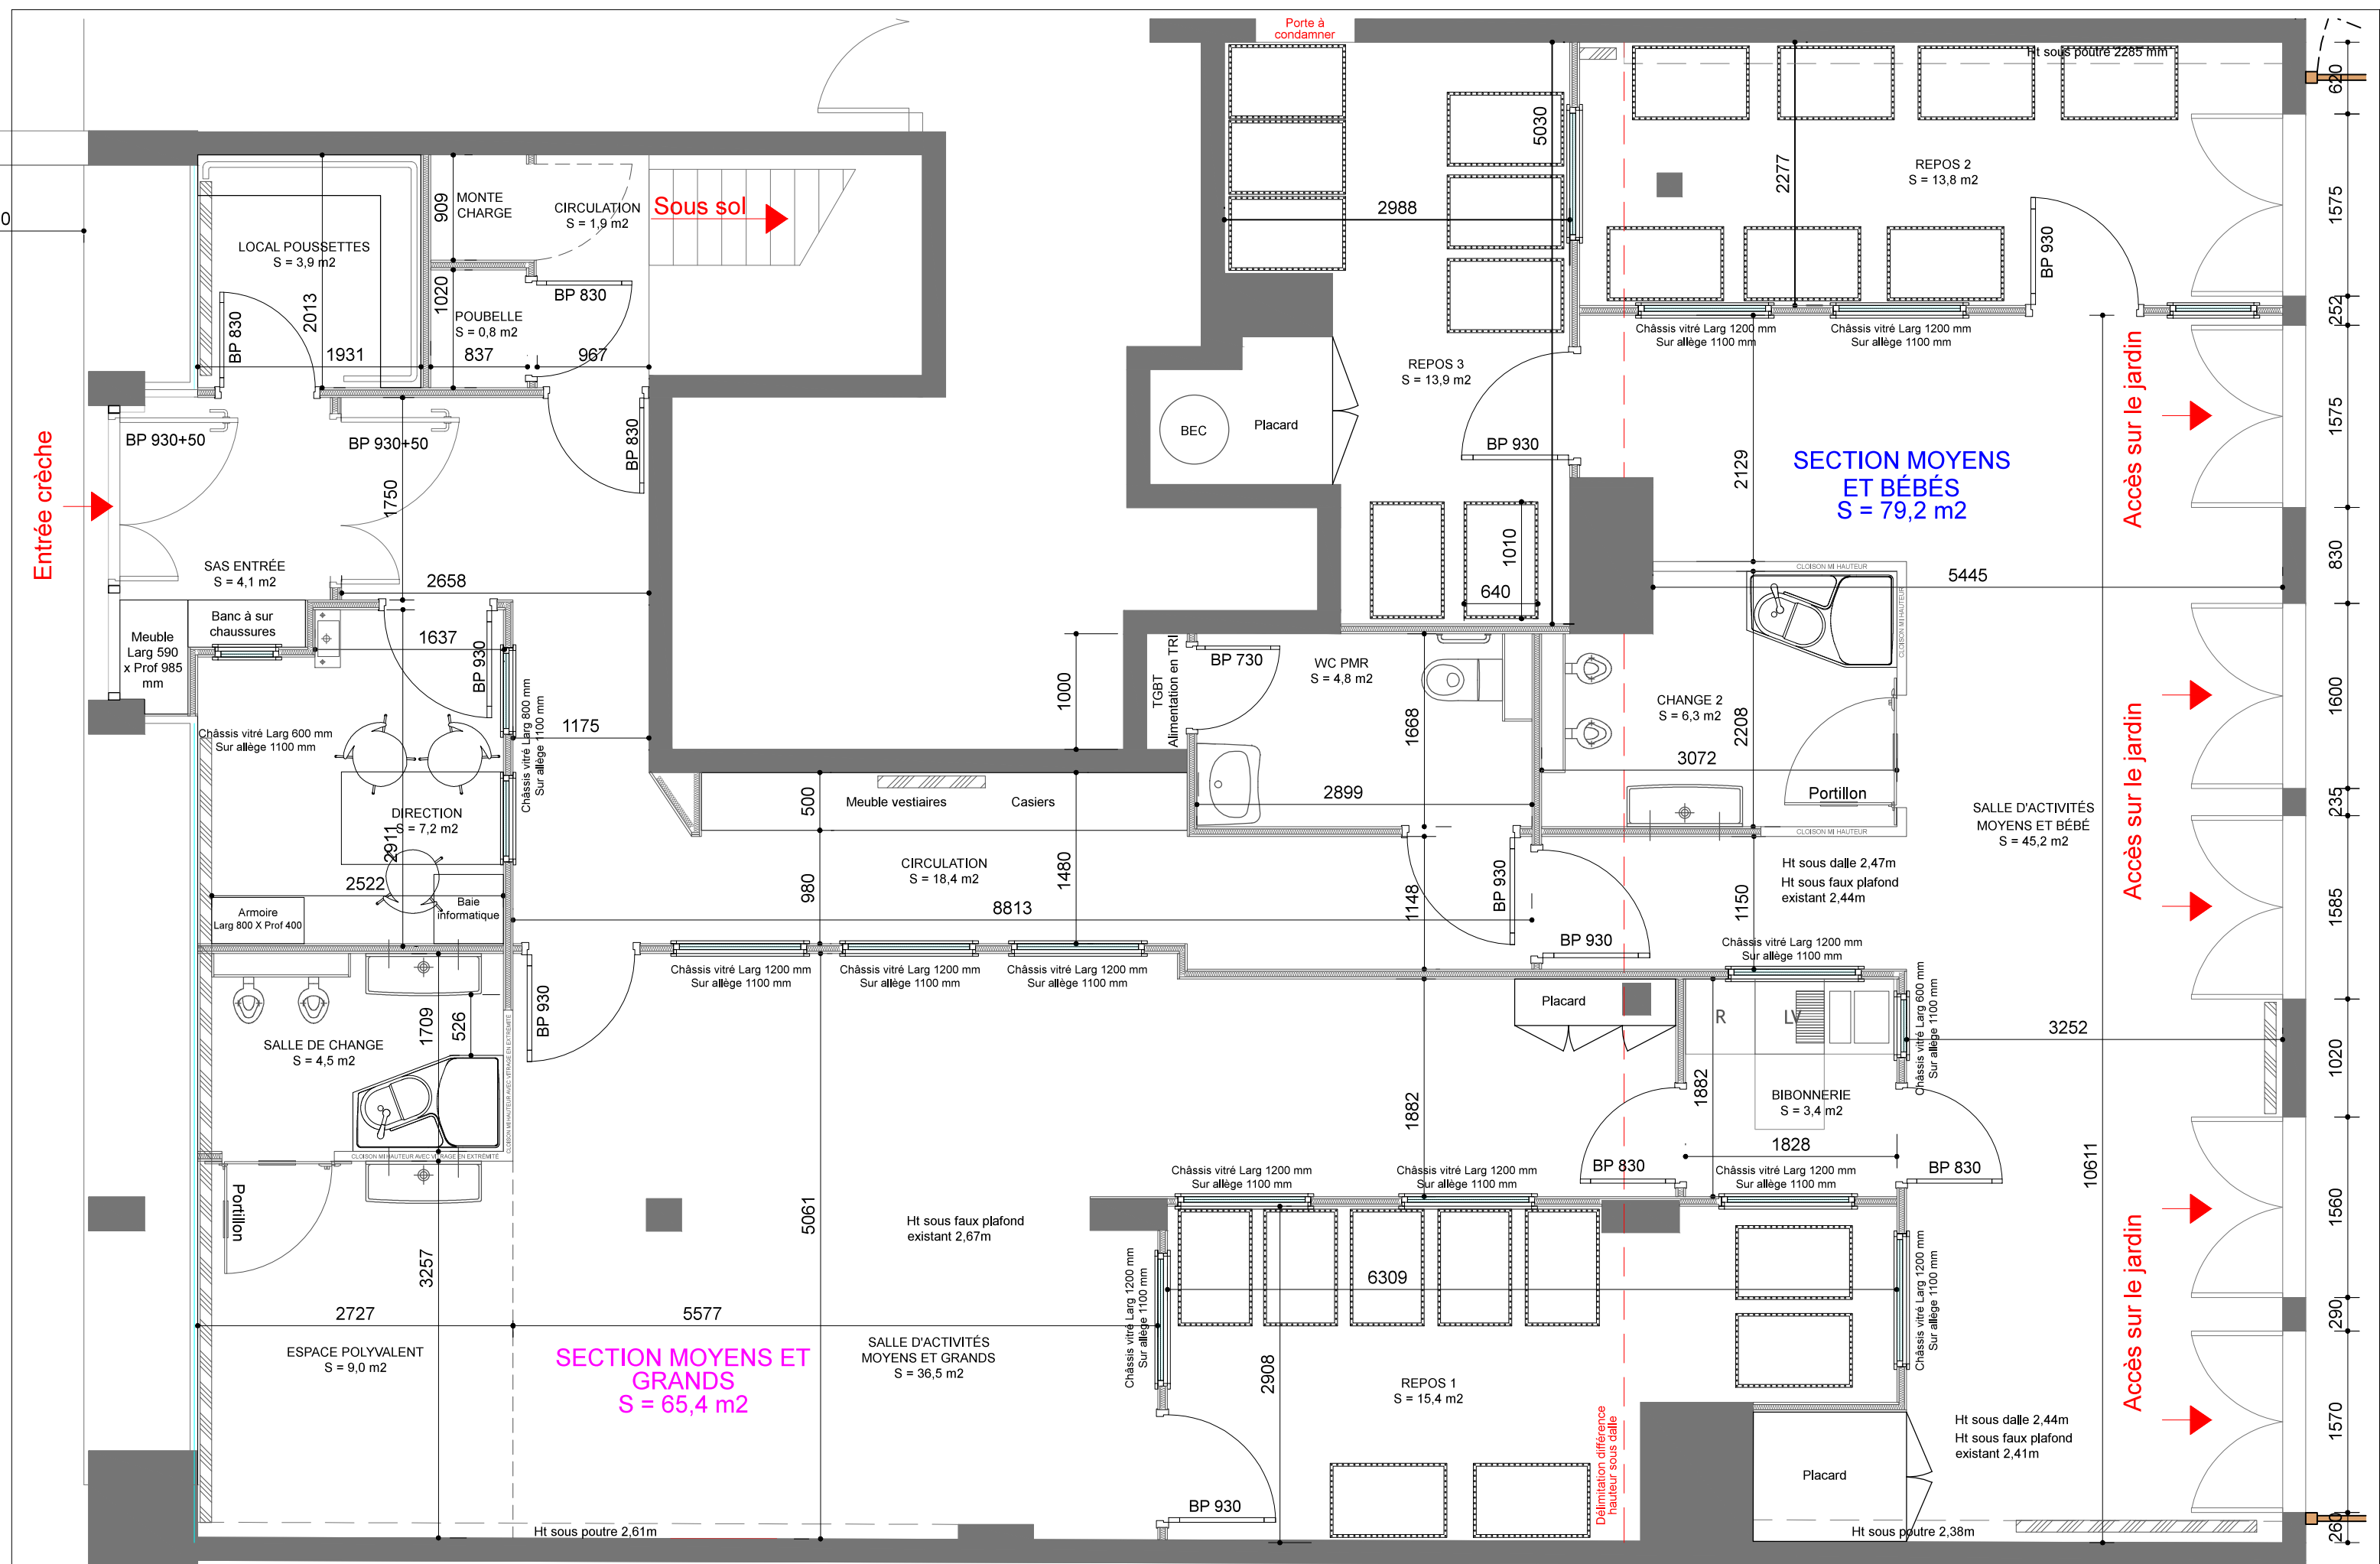

	Maître d'oeuvre Orchestra Agencements SAS 57 rue Dalayrac 94120 Fontenay sous-bois Tél : 01 41 79 53 62	Maître d'ouvrage LES PETITES CANAILLES 36 rue Pierret - 92200 Neuilly sur Seine Tél : 01 58 83 48 39	Affaire LPC SCEAUX - 25 Berceaux Surface : 280 m2	Libellé Implantation RDC	Resp. Dossier : Benoît CHAMPIGNEUX			
					Tél : 06 48 18 04 03		Mail : benoit.orchestra@orange.fr	
					Date : 05 / 03 / 2018		Indice : 0	
							Echelle : 1/50	
					Format : A3			

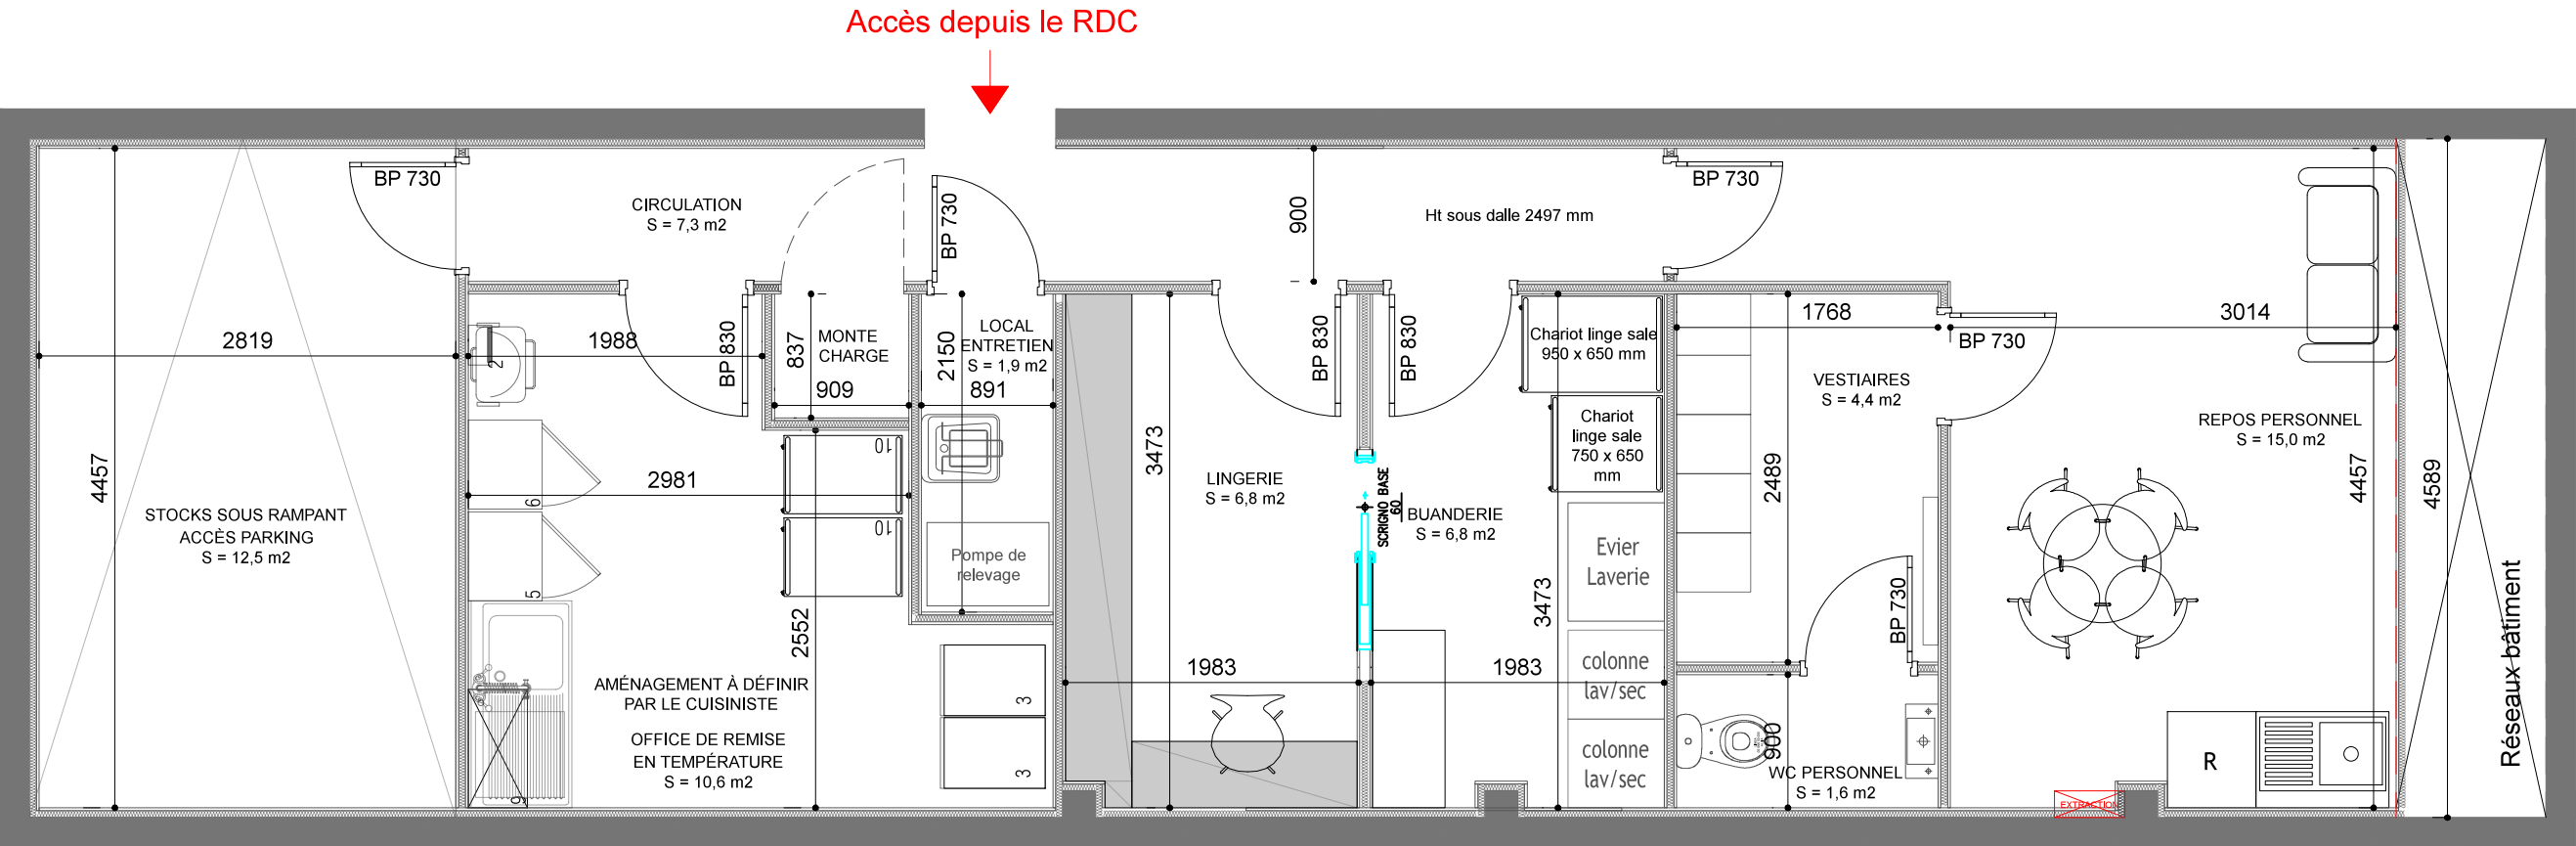

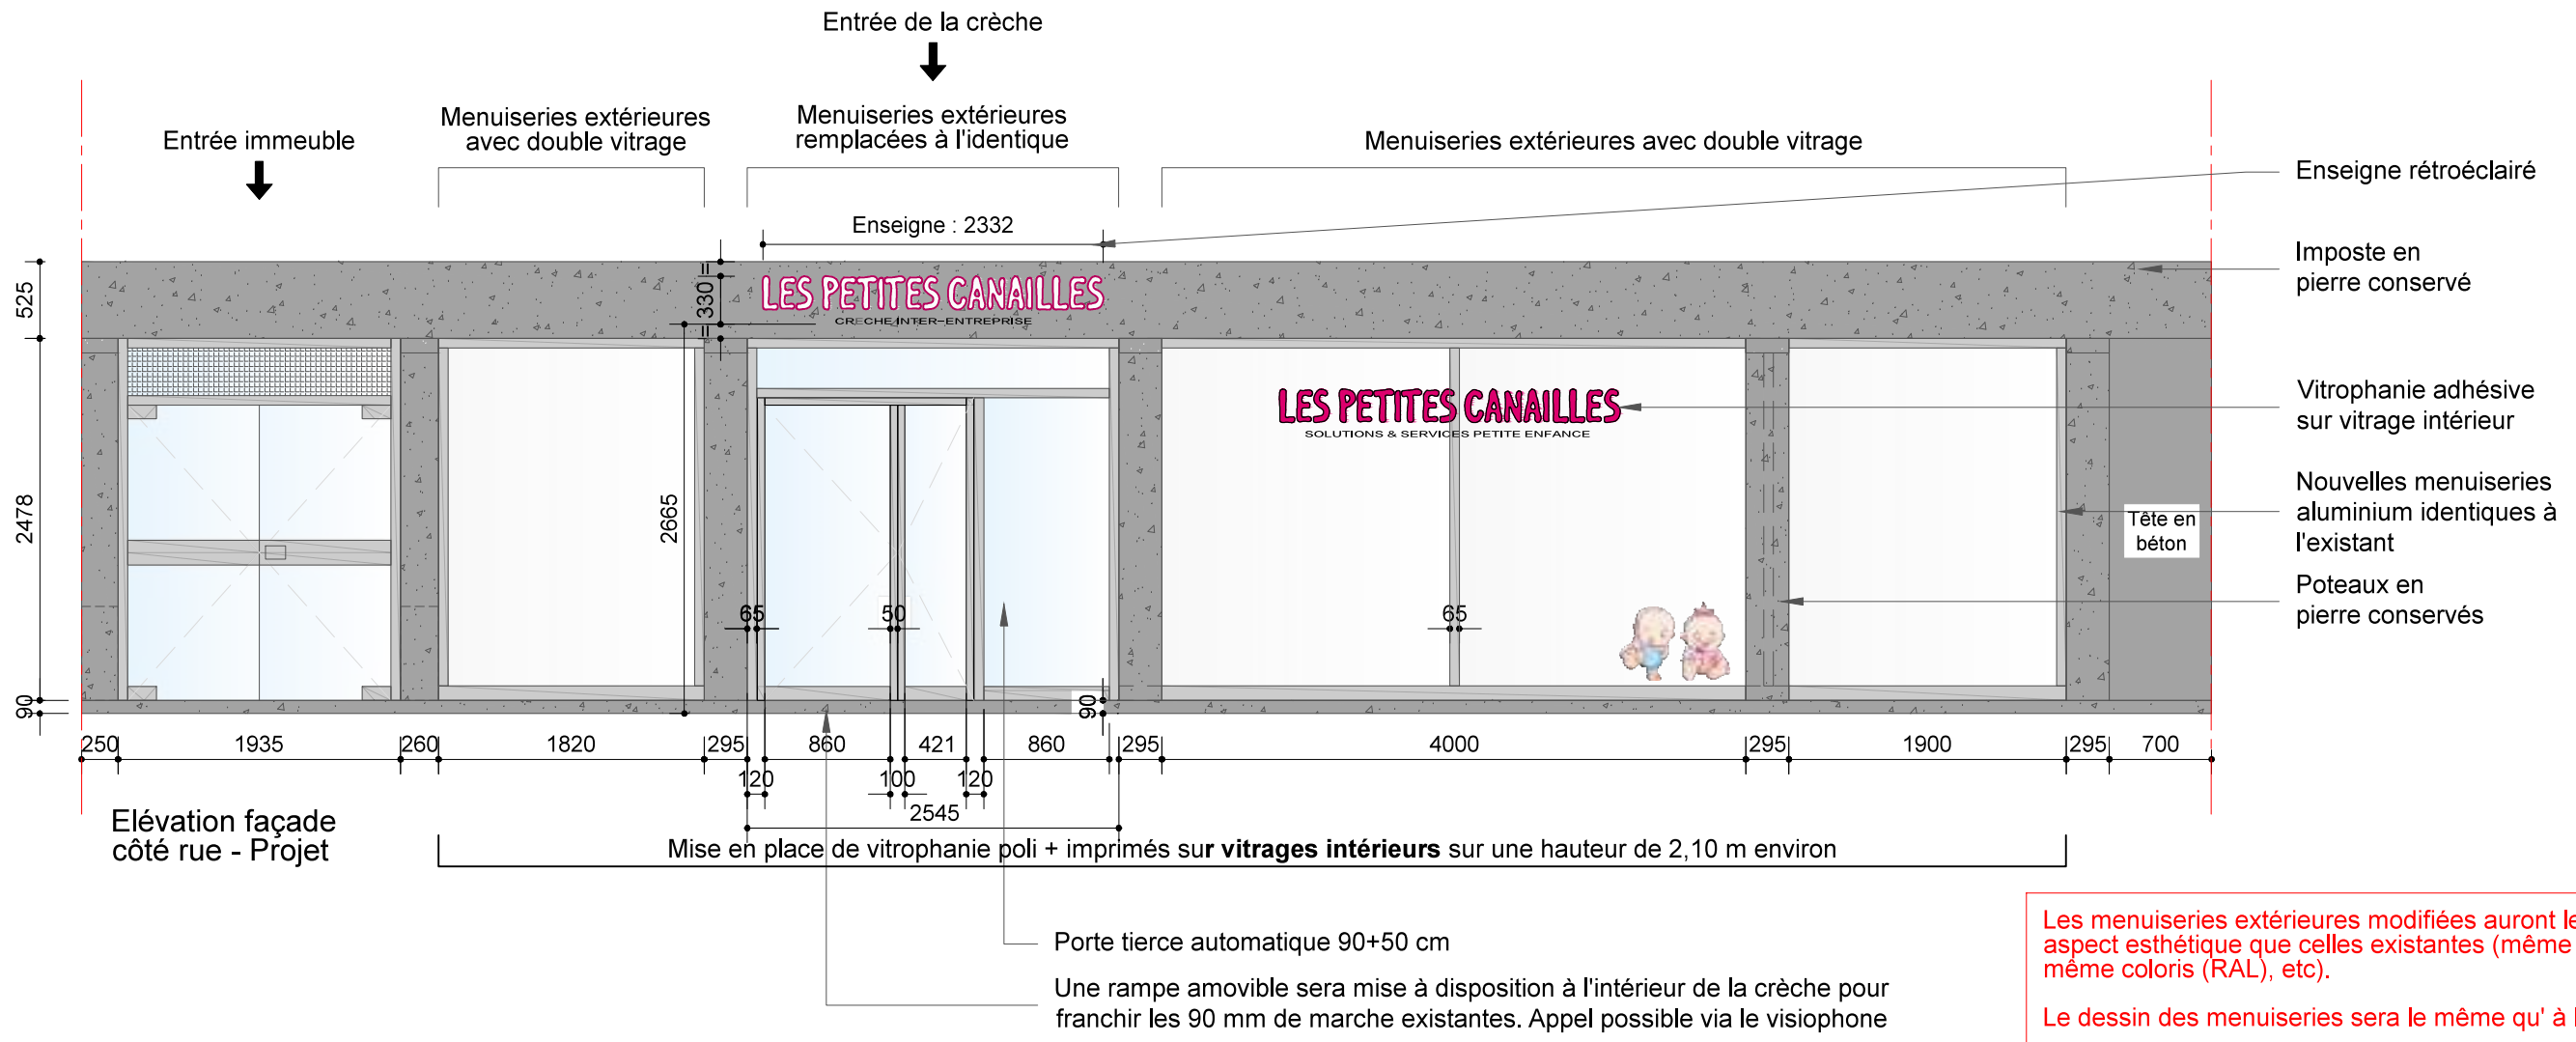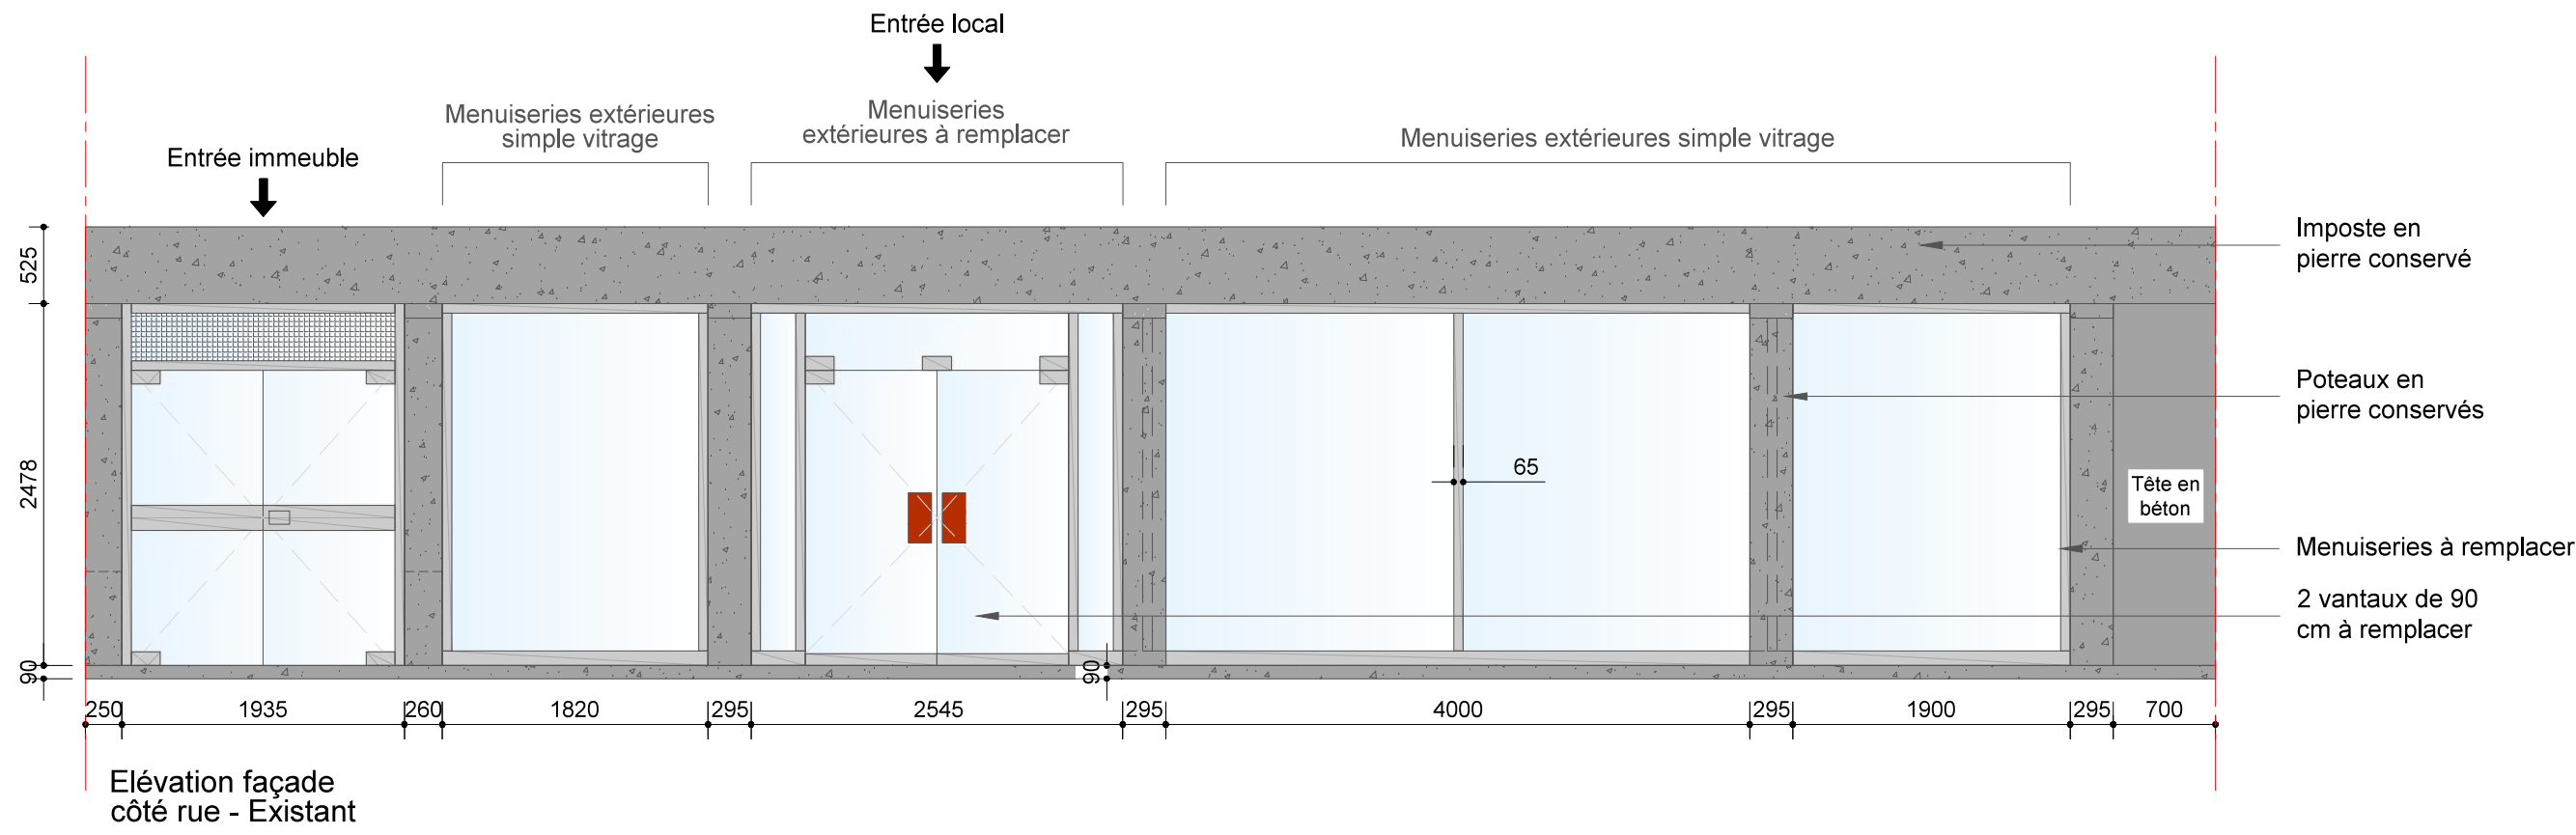

Les menuiseries extérieures modifiées auront le même aspect esthétique que celles existantes (même matériaux, même coloris (RAL), etc).

Le dessin des menuiseries sera le même qu' à l'existant.

	Maître d'oeuvre Orchestra Agencements SAS 57 rue Dalayrac 94120 Fontenay sous-bois Tél : 01 41 79 53 62	Maître d'ouvrage LES PETITES CANAILLES 36 rue Pierret - 92200 Neuilly sur Seine Tél : 01 58 83 48 35	Affaire LPC SCEAUX - 25 Berceaux <u>Surface</u> : 280 m2	Libellé Elévation façade côté rue Existant / Projet	Resp. Dossier : Benoît CHAMPIGNEUX			
					Tél : 06 48 18 04 03	Mail : benoit.orchestra@orange.fr		
					Date : 05 / 03 / 2018	Indice : 0	Echelle : 1/50	Format : A3




Photo façade côté jardin - Existant



Exemple de stores bannes



- Projet comprenant :
- Installation des stores bannes
 - Réalisation d'une terrasse sur plot avec un sol dalles caoutchouc
 - A définir : suppression ou non des jardinières
 - Réalisation d'une clôture bois hauteur 1,30 m
 - Changement des menuiseries extérieures : passage en double vitrage et mise en place de menuiseries aluminium
- Compris réalisation des grilles pour extraction et prise d'air

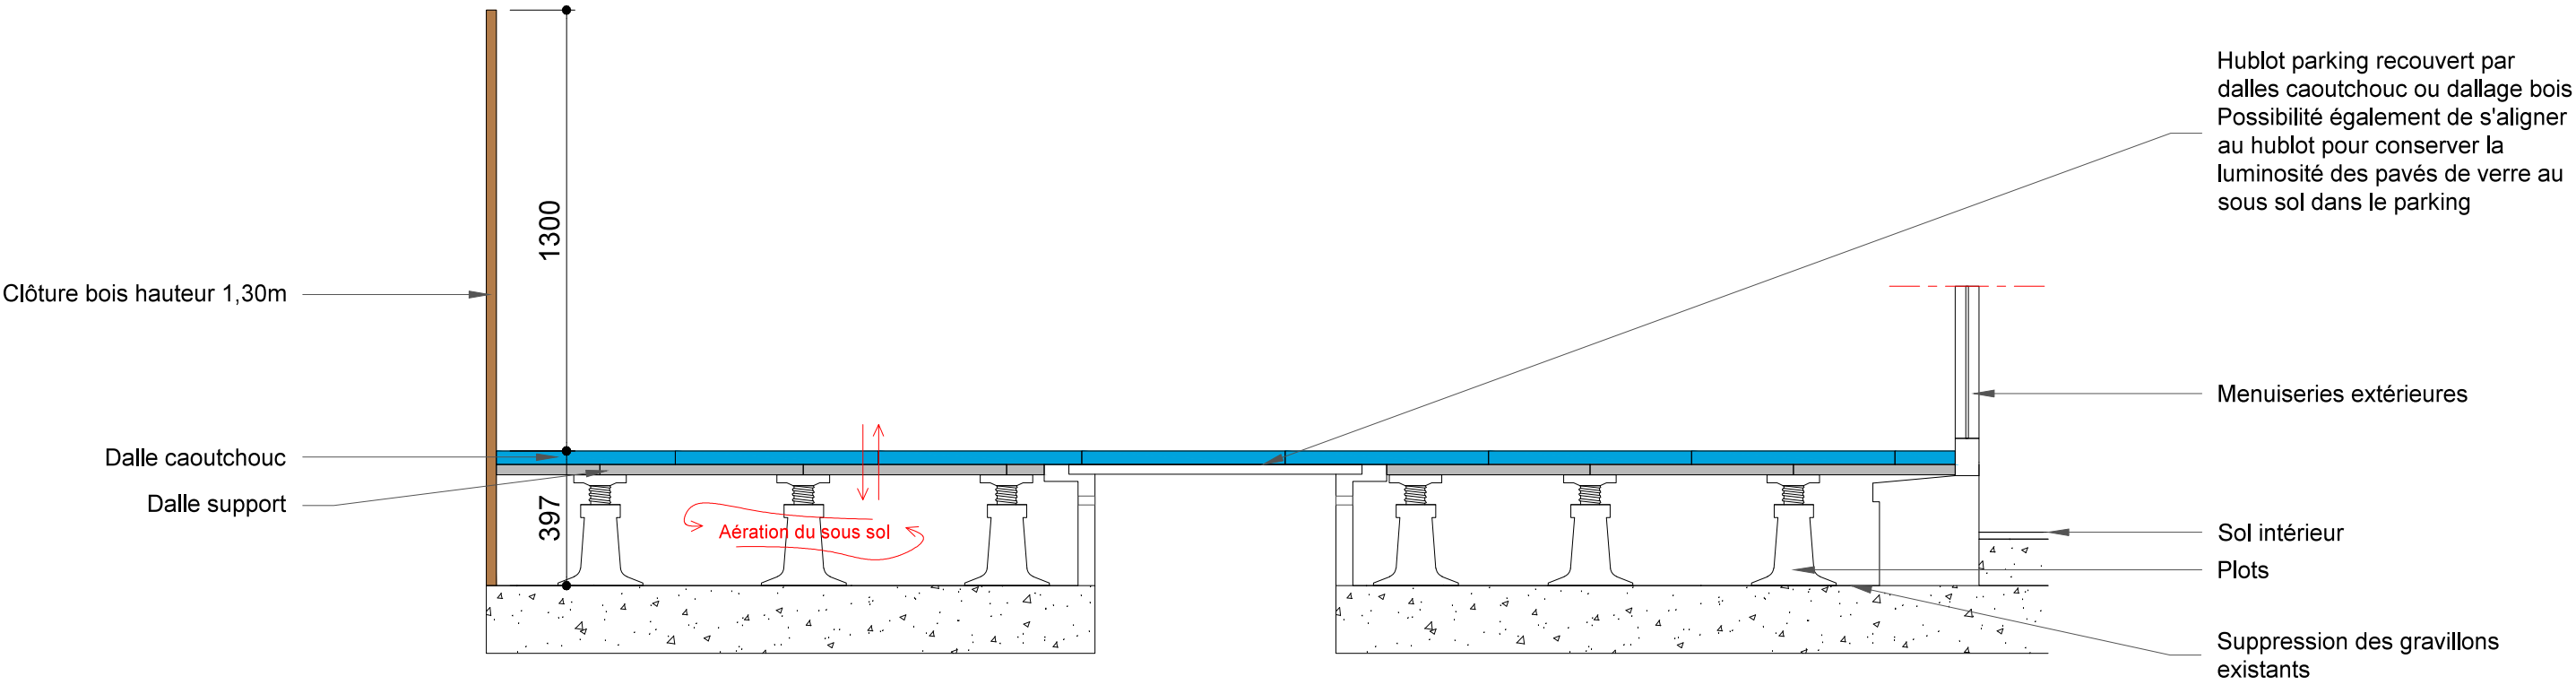

- Projet de revêtement de sol comprenant :
- Suppression des gravillons existants
 - Remise en état étanchéité si nécessaire
 - Mise en place des plots
 - Installation des dalles supports
 - Mise en place des dalles caoutchouc agréées pour les crèches ou dallage bois



Exemple de plots



Exemple de dalles caoutchouc




Exemple d'aménagement extérieur



Localisation jardin - 146, rue Houdan à Sceaux

Accès depuis habitation résidents
Hall de l'immeuble
Accès sur le jardin depuis la crèche

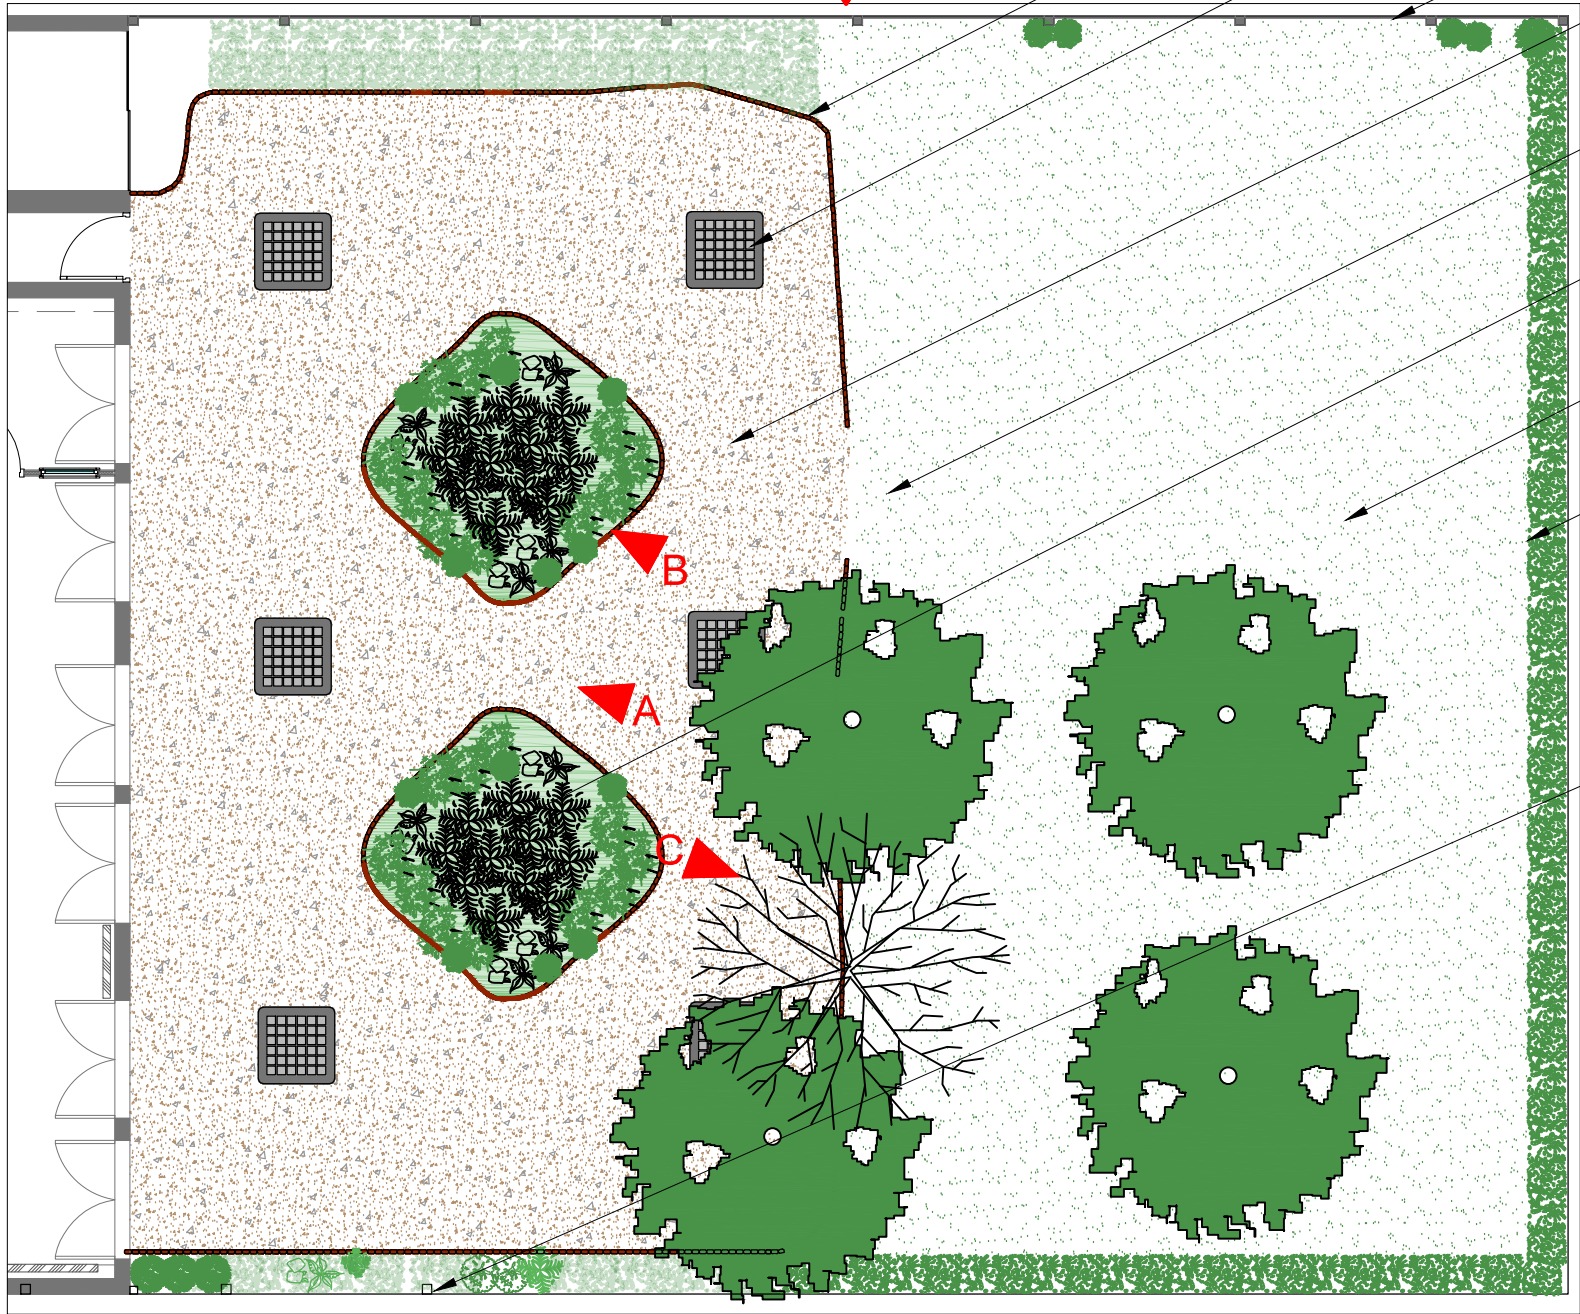

Cheminements au sol

Hublots du parking sous terrain

Séparation mur béton

Sol gravillons

Pente pour accès à la deuxième partie du jardin en soubassement

Jardinière

Sol pelouse

Séparation du voisinage avec des buissons

Séparation du voisinage avec une clôture



Vue A



Vue B



Vue C



Maître d'oeuvre
Orchestra Agencements SAS
57 rue Dalayrac 94120 Fontenay sous-bois
Tél : 01 41 79 53 62

Maître d'ouvrage
LES PETITES CANAILLES
36 rue Pierret - 92200 Neuilly sur Seine
Tél : 01 58 83 48 39

Affaire
LPC SCEAUX - 25 Berceaux
Surface : 280 m2

Libellé
Implantation existante jardin

Resp. Dossier : Benoît CHAMPIGNEUX			
Tél : 06 48 18 04 03	Mail : benoit.orchestra@orange.fr		
Date : 05 / 03 / 2018	Indice : 0	Echelle : 1/100	Format : A3

- Implantation projet jardin - version B
- réalisation d'une clôture bois hauteur 1,30m
 - suppression des 2 jardinières
 - réalisation d'un sol dalles souples sous plots
 - remplacement des menuiseries extérieures à l'identique (pour passer en double vitrage) + grilles extraction et prise d'air VMC
 - installation de stores banes

- Remplacement des menuiseries extérieures à l'identique (sauf grilles VMC)
- Réalisation d'une clôture pleine en bois hauteur 1,30 m
- Hublots du parking sous terrain recouvert par dallage sur plots




Exemple abri de jardin



Exemple aménagement de jardin



Exemple clôture bois

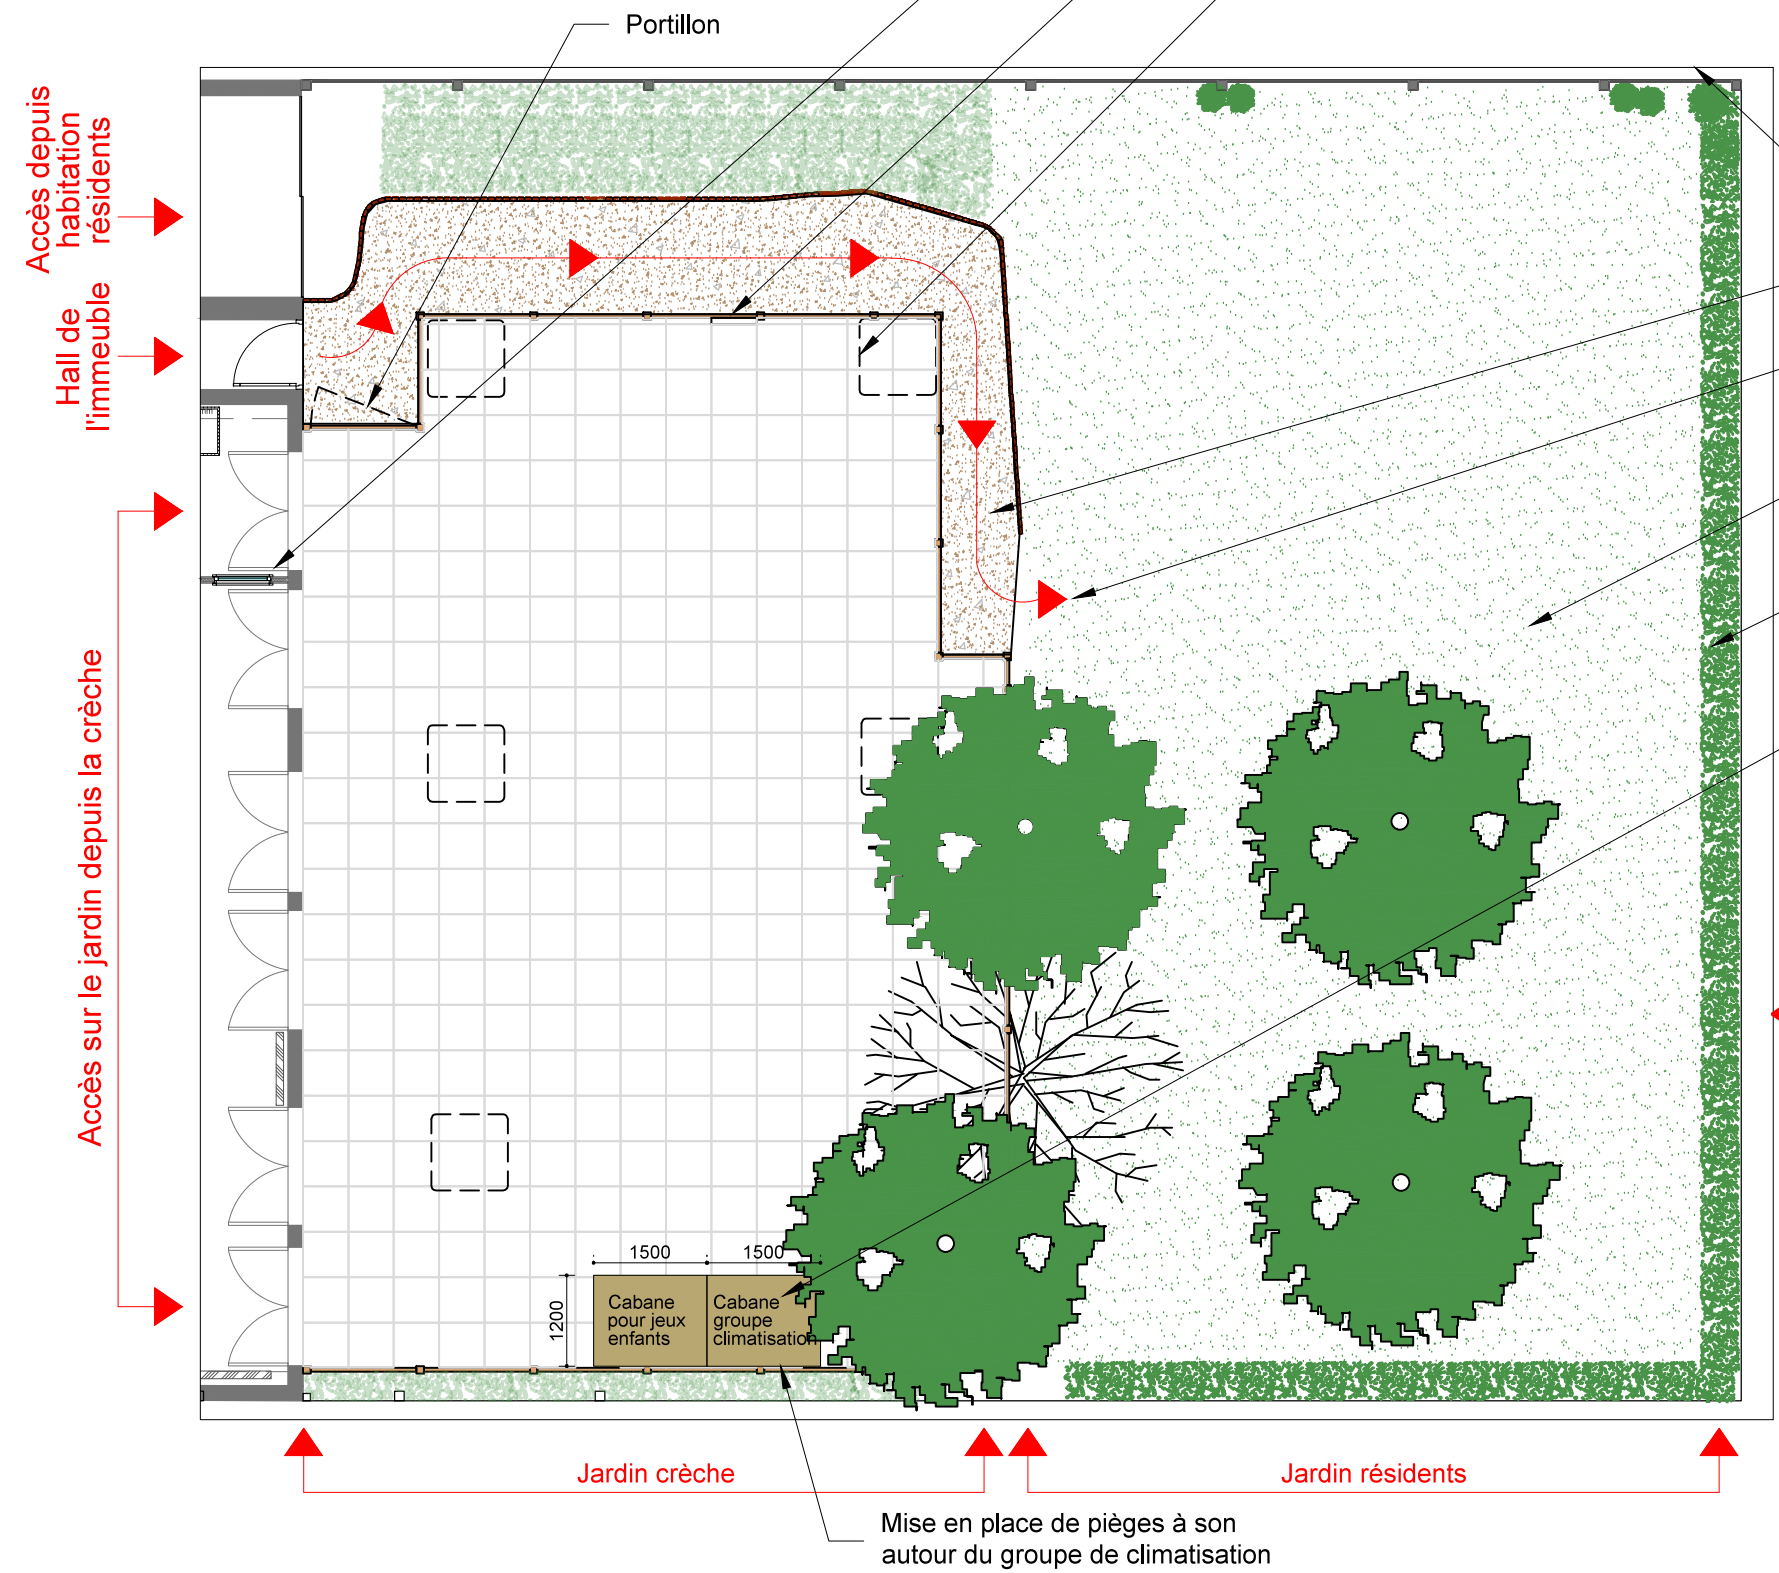

- Séparation mur béton
- Sol gravillons existant
- Accès des résidents à la deuxième partie du jardin
- Sol pelouse
- Séparation du voisinage avec des buissons
- Cabanes de jardin en bois
Dimensions : Larg 1500 x Prof 1200 mm, Hauteur environ de 1,30m



Localisation jardin - 146, rue Houdan à Sceaux
Plan existant



CRÈCHE 25 BERCEAUX - LPC SCEAUX

146, RUE HOUDAN
92330 SCEAUX

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX

Maître d'ouvrage :



LES PETITES CANAILLES

Monsieur Damien TONDELLI
36, rue Pierret F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Téléphone : 08 10 00 81 89
Email : dtondelli@lespetitescanailles.fr

Maître d'œuvre :



ORCHESTRA AGENCEMENTS

Monsieur Benoît CHAMPIGNEUX
57, Rue Dalayrac 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Téléphone : 01 41 79 53 62
Email : benoit.orchestra@orange.fr

Bureau de contrôle :



BTP CONSULTANTS

Immeuble Le Central II
460 Clos la Courtine 93194 NOISY LE GRAND CEDEX
Téléphone : 01 55 85 17 63

Le projet consiste en l'aménagement d'une crèche de 25 berceaux située au 146, rue Houdan dans la ville de Sceaux par le groupe Les Petites Canailles.

L'accès des enfants et des parents se fera depuis la rue Houdan (entrée existante).

Les différents espaces de la crèche seront :

- Une zone d'accueil en rez-de-chaussée comprenant une entrée et le local pour les poussettes, la circulation principale, le bureau de la directrice, à proximité des sections ainsi que des WC accessibles au public.
- Une zone des bébés/moyens en rez-de-chaussée, comprenant une salle d'activités, une salle de change, deux salles de repos.
- Une zone des moyens/grands en rez-de-chaussée, comprenant une salle d'activités, une salle de change, une salle polyvalente, une salle de repos.
- Les deux salles d'activités communiquent via la bibonnerie.
- Une zone en code du travail pour le personnel de la crèche au sous sol (local entretien, buanderie-lingerie, office de réchauffage, repos personnel, vestiaires, WC personnel).

Pour faciliter les livraisons, un monte charge sera mis en en place pour établir des échanges entre le rez-de-chaussée et le sous sol (réalisation d'une trémie avec accord de la copropriété).

Les travaux, ci-après seront abordés pour l'aménagement de la crèche :

- Curage
Curage de l'ensemble du local (cloisonnements, sols et plafonds)
- Maçonnerie
Création de la trémie et carottages pour passage des réseaux d'évacuation
- Plâtrerie
Réalisation d'une nouvelle distribution des pièces
- Menuiseries extérieures
Remplacement des menuiseries côté rue en conservant l'aspect esthétique. Mise en place d'un double vitrage. Réalisation de portes battantes automatiques à l'entrée avec accès par digicode et visiophone.
Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures en bois côté jardin par des menuiseries aluminium avec préconisation pour un double vitrage.
L'aspect esthétique de l'ensemble des menuiseries existantes sera conservé.
- Electricité courant fort et courant faible
Réalisation d'un nouveau réseau électrique
- Plomberie

Réalisation d'un nouveau réseau de plomberie

Mise en place d'une ou deux pompes de relevage au sous sol avec report d'alarme dans le bureau de direction.

➤ Ventilation

Mise en place d'une VMC double flux. Extraction en façade côté jardin par des grilles dans les nouvelles menuiseries extérieures. Voir plan élévation façade côté jardin.

➤ Climatisation

Selon études du climaticien, mise en place d'une climatisation au sein de la crèche avec groupe extérieur. Le groupe extérieur ne sera pas visible, il sera placé dans une cabane bois identique à celle mise en place pour les jouets des enfants. Le bruit sera atténué avec la réalisation de pièges à son et avec l'orientation du groupe qui se fera vers le jardin et non vers le bâtiment.

Concernant les radiateurs, possibilité de les déplacer selon nouvelle distribution des pièces. Le réseaux d'eau chaude des radiateurs du local est indépendant.

Si la mise en place d'une climatisation est possible, le réseau sera neutraliser et les radiateurs retirés.

➤ Faux plafond

Réalisation des faux plafond

➤ Revêtements carrelage faïence

Réalisation des revêtements carrelage et faïence

➤ Revêtement de sols souples

Réalisation des revêtements de sols souples

➤ Peinture

Mise en peinture des revêtements muraux et faux plafond

➤ Agencement

Réalisation de mobiliers : vestiaires enfants, meuble change, meuble sur chaussures

➤ Menuiserie intérieure

Mise en place de blocs porte bois et châssis vitrés

➤ Stores

Mise en place de nouveaux stores intérieurs

Mise en place de stores bannes extérieurs avec accord de la copropriété. Voir plan façade côté jardin

➤ Signalétique

Mise en place en façade d'une enseigne avec lettrage rétroéclairé

Le projet souhaite également se voir aménager une partie du jardin de la copropriété avec son accord afin de réaliser un espace extérieur pour les enfants (réalisation d'un nouveau sol, d'une clôture, de cabanes en bois pour le groupe de climatisation et les jouets des enfants, traitement des végétations en fonction du nouvel aménagement, mise en sécurité du jardin).

Voir plans

Note méthodologie travaux :

- Horaires travaux : entre 8h et 18h du lundi au vendredi
- Travaux suivis par un bureau de contrôle et un coordinateur SPS pour la sécurité du chantier
- Nuisances sonores effectuées pendant les horaires convenues dans l'arrêté 2016-194 du 6 juillet 2016 (entre 8h et 19h30).




1 - Local ordures



2 - Local technique




3 - Parking

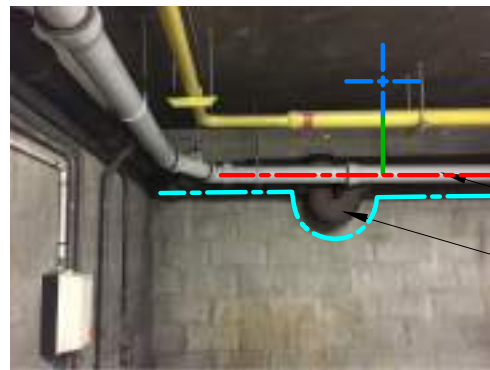

4 - Chaufferie

Eaux usées

Eaux pluviales

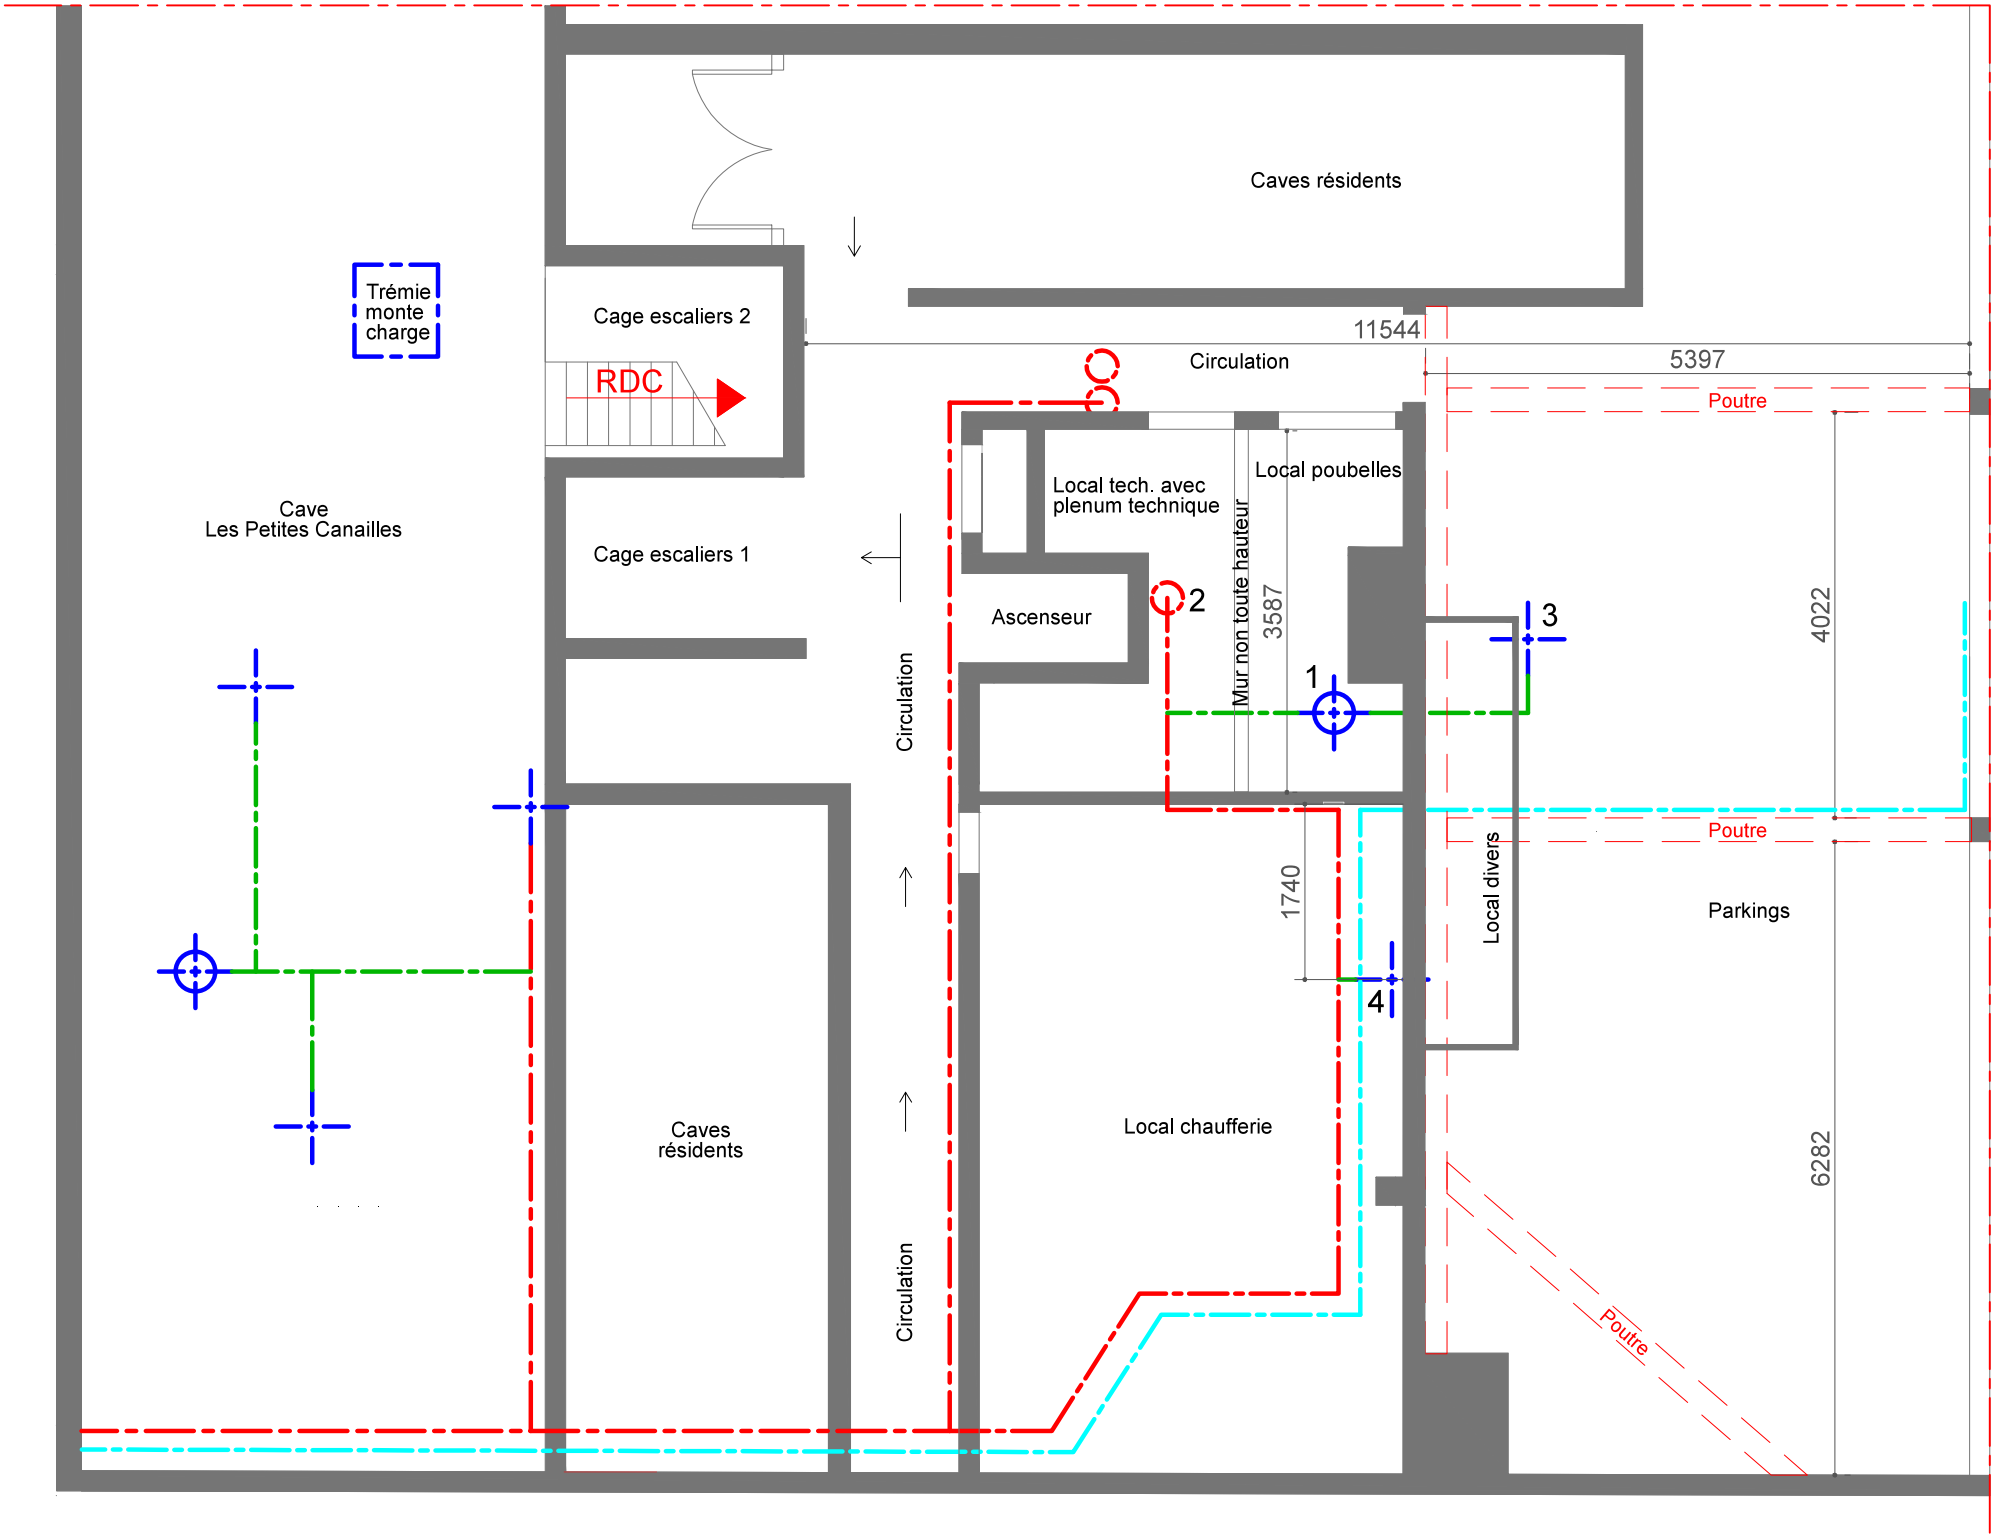

LÉGENDE



Carottages 110 mm PROJET



Carottages 50 mm PROJET



Réseau évacuation PROJET



Réseau eaux pluviales



Réseaux évacuations EXISTANT



Maître d'oeuvre Orchestra Agencements SAS
57 rue Dalayrac 94120 Fontenay sous-bois
Tél : 01 41 79 53 62

Maître d'ouvrage LES PETITES CANAILLES
36 rue Pierret - 92200 Neuilly sur Seine
Tél : 01 58 83 48 39

Affaire LPC SCEAUX - 25 Berceaux
Surface : 280 m2

Libellé Plan de carottage sous sol

Resp. Dossier : Benoît CHAMPIGNEUX

Tél : 06 48 18 04 03

Mail : benoit.orchestra@orange.fr

Date : 05 / 03 / 2018

Indice : 0

Echelle : 1/75

Format : A3



Planning prévisionnel travaux SCEAUX - Crèche Les Petites Canailles
146, rue Houdan - Sceaux (92330)

[illegible]



CRÈCHE 25 BERCEAUX - LPC SCEAUX

146, RUE HOUDAN
92330 SCEAUX

DEMANDES À ABORDER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA CRÈCHE

Maître d'ouvrage :



LES PETITES CANAILLES

Monsieur Damien TONDELLI
36, rue Pierret F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Téléphone : 08 10 00 81 89
Email : dtondelli@lespetitescanailles.fr

Maître d'œuvre :



ORCHESTRA AGENCEMENTS

Monsieur Benoît CHAMPIGNEUX
57, Rue Dalayrac 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Téléphone : 01 41 79 53 62
Email : benoit.orchestra@orange.fr

Bureau de contrôle :



BTP CONSULTANTS

Immeuble Le Central II
460 Clos la Courtine 93194 NOISY LE GRAND CEDEX
Téléphone : 01 55 85 17 63

Dans le cadre de l'aménagement de la future crèche, les demandes ci-dessous sont soumises à l'assemblée générale :

➤ **A l'intérieur du local :**

- Réalisation de 7 carottages dans le cadre de la réalisation d'un nouveau réseau des évacuations d'eaux vannes et eaux usées :
 - 2 carottages de 50 mm et 1 carottages de 110 mm dans les espaces communs en sous sol (cf. plan de carottage sous sol)
 - 3 carottages de 50 mm et 1 carottage de 110 mm dans la cave appartenant aux Petites Canailles (cf. plan de carottage sous sol)
- Rattachement des évacuations créées sur les évacuations existantes en sous sol, en sous face de la dalle (cf. plan de carottage sous sol).
- Réalisation d'une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous sol pour mettre en place un monte plats (cf. plan de carottage sous sol)
Dimensions : Longueur 910 x Largeur 837 mm environ.
- Neutralisation du réseau de radiateurs au rez-de-chaussée

➤ **Façade côté rue (cf. plan de façade côté rue) :**

- Pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche.
Dimension enseigne : Largeur 2332 x Hauteur 330 mm.
- Remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiseries aluminium avec double vitrage). Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone.
- Mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue.

➤ **Façade côté côté jardin (cf. plan de façade côté jardin) :**

- Pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtre (cf. plan de façade).
Dimensions : Longueur 3420 mm, déporté entre 2,0 et 2,5m.
- Remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiseries aluminium avec double vitrage).
- Création de grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche.

➤ **Jardin :**

- Suppression de 2 jardinières existantes en partie centrale du jardin (cf. plan implantation projet du jardin)
- Réalisation d'une terrasse en sol souple sur plot (cf. plan implantation projet du jardin). Dalles de revêtement en caoutchouc ou aspect bois à définir selon demandes de la

copropriété (cf. coupe de principe détail de la terrasse extérieure)

Recouvrement ou non des hublots du parking à définir.

- Pose d'une clôture bois de 1,30m avec portillon d'accès (cf. plan implantation projet du jardin).
- Pose d'un abri de jardin démontable pour rangements des jouets des enfants.

Dimensions : Larg 1500 x Prof 1200 mm. Hauteur d'environ 1,30m.

- Pose d'un abri de jardin avec prise d'air pour logement du groupe de climatisation extérieur (non visible de l'extérieur) avec installation de pièges à son (atténuation du bruit). Groupe de type RXYSQ-T de chez DAIKIN ou équivalent, selon étude du climaticien.

Dimensions de l'abri de jardin : Larg 1500 x Prof 1200 mm. Hauteur d'environ 1,30m.

Dimensions du groupe de climatisation : Larg 900 x Prof 320 x Hauteur 1345 mm.
